

Laudo de Execução de Obra

A obra referente ao contrato de repassa 868676/2018 cujo o objeto é pavimentação de vias publicas no bairro Tamã (contemplando a pavimentação em bloco sextavado das Ruas Deputado Jose Aldo , João Fernades , Terezinha Pinheiro , Maria Santana Sales e trecho da Av Saul Luiz de França ) , possui um percentual de 18,10% executado conforme cronograma abaixo.

**CAIXA**

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	868676/2018	GESTOR	MONTEZ CLAROS
Nº SICONV	39472018	MUNICÍPIO / UF	MANGA/MG
Nº CTER	0006/2020	EMPRESA EXECUTORA	IGOR OLIVEIRA DOS SANTOS BIRELI
PROPOSTANTE / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA		
CNPJ	00 010 739/0001		
OBJETO DO CTER	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
LOCALIDADE / ENDEREÇO	BARRIO TAMÁ		
PROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO		
AÇÃO / MODALIDADE	INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO		
DATA ASSINATURA	31/03/2018		
Grau de Sigilo	#PUBLICO		

Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Acumulado	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
R\$ 68.556,00	R\$ 98.556,00	R\$ 72.045,01	R\$ 106.666,29	R\$ 348,31	R\$ 58.477,84	R\$ 144.816,76
% 18,10%	% 19,10%	% 18,22%	% 12,61%	% 10,93%	% 26,33%	% 100,00%
R\$ 68.556,00	R\$ 171.680,02	R\$ 277.279,26	R\$ 348.021,56	R\$ 405.086,40	R\$ 549.916,16	


A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de fontes de obra.

Informe abaixo o número do período em que os eventos serão concluídos (mesado por eventos)

CREATING NA EMPRESA  
ENGENHEIRO CIVIL  
LEGO TAIVARES





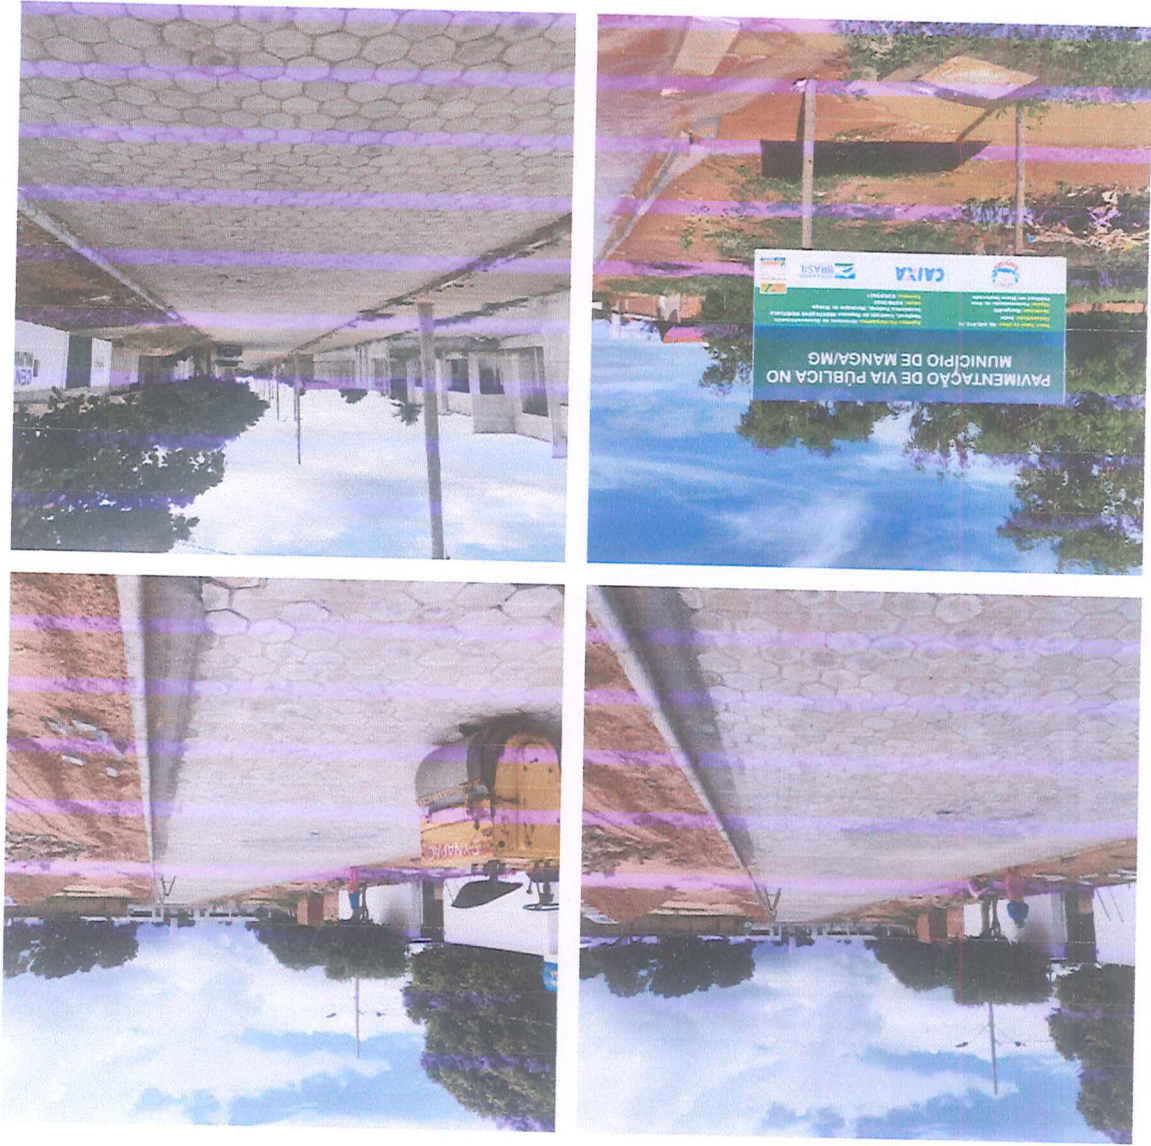

*Diego Tavares*  
Diego Tavares  
Engenheiro Civil
